




БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД



ПРОГРАММА 40 ХРАМОВ


ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА В СЕЛЕ ДЕВИЧКИ, КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

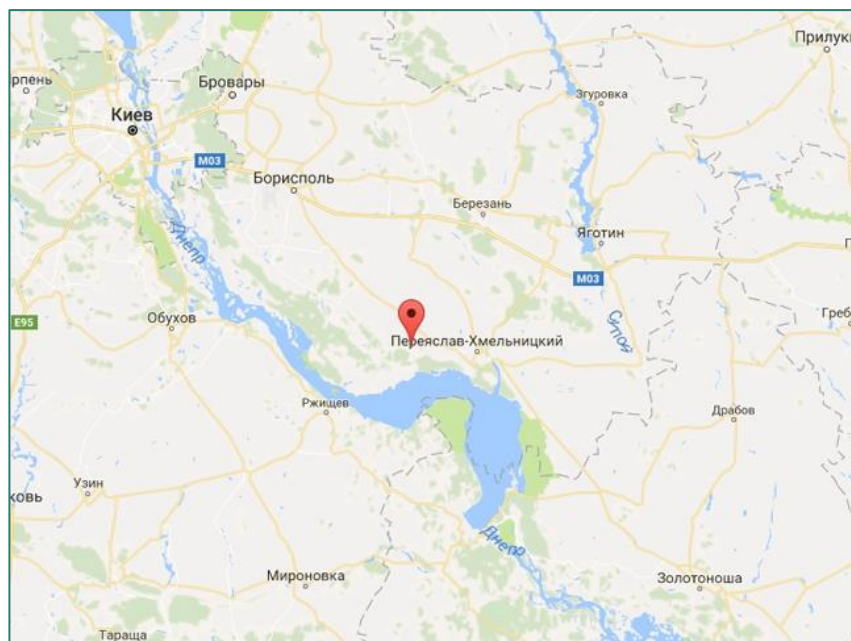

В данном населенном пункте, в связи с особым статусом, не разрешается строительство капитальных зданий, и поэтому решением вопроса является сооружение Храма в виде МАФ (*объекта малой архитектурной формы*).

Малая архитектурная форма (МАФ) — это легкое, быстровозводимое, мобильное сооружение, не привязанное к фундаменту. Ее достоинства определяются простотой конструкции, изяществом архитектуры, соответствующим масштабом, освещением и цветом, обоснованным применением строительных материалов: металла, дерева, водостойчивой фанеры, плит из пластмасс, стеклопластика, стеклоблоков.

Технические характеристики будущего Храма в с.Девички:

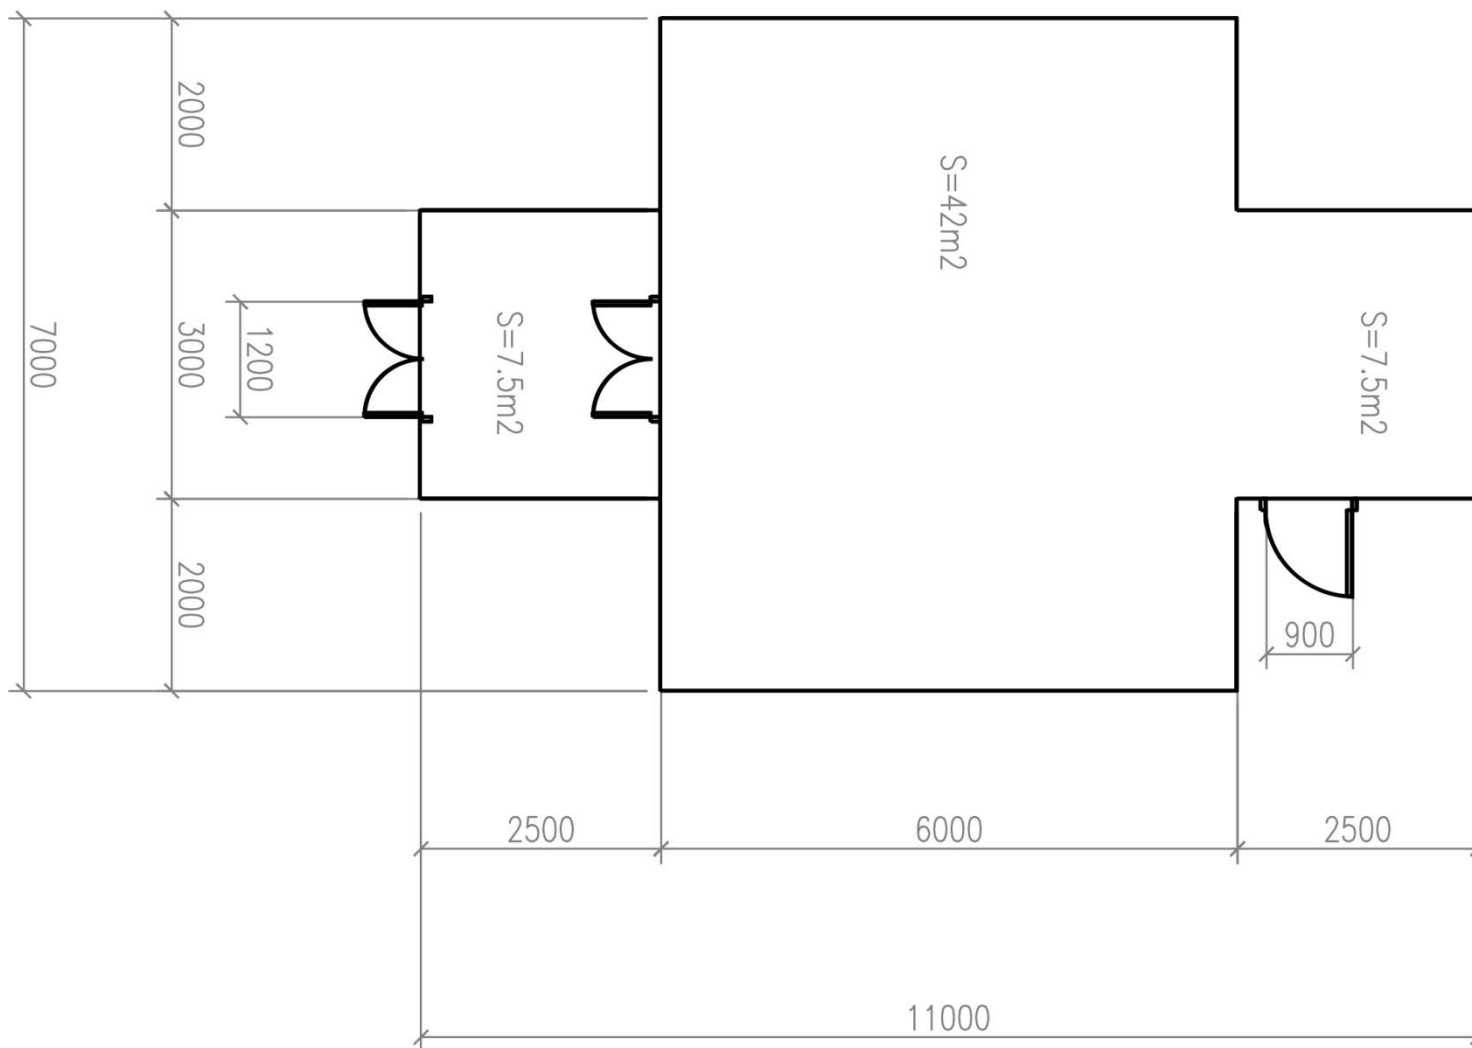

Площадь – 57 м. кв.

Вместимость прихожан – 60 чел.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Фундамент	Монолитная плита, толщина 100 мм
Стены	Металлокаркас, наружная отделка – металлический блок-хаус (<i>с видом под сруб</i>)
Кровля	Купол – один. Двухскатная, каркас из металла и дерева, покрытие - проф.лист, утеплитель 150 мм.
Полы	Половая доска, утеплитель 150 мм
Внутренняя отделка	Утеплитель 150 мм, стеновые панели
Окна и двери	Входные двери – металлические, окна и внутренние двери – металлопластик.

СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА:

1 календарный месяц с момента приобретения материалов.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ХРАМА В ВИДЕ МАФ:

Приобретение строительных материалов – **309 319 грн.**

Оплата работ – **105 655 грн.**

Приобретение церковной утвари – **59 829 грн.**

Всего: **474 803 грн.**

Сметная стоимость не включает в себя подключение электроэнергии от ТП (трансформаторная подстанция) к Храму. Будет определена после получения тех. условий.



**Сбор средств ведется и БФ «Фавор» и общиной храма в честь
«СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА»:**



Фонд будет осуществлять помощь по
закупке материалов и церковной
утвари, на сумму – **369 148 грн.**

Контакты:

Настоятель храма: Протоиерей Леонид Смаглюк.

Моб.тел.: +38 (093) 853-44-19.

Фейсбук:  [БФ Фавор](#)

Приложение №1:

1-й ЭТАП (УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА, СООРУЖЕНИЕ МЕТАЛЛОКАРКАСА)									
<u>Будівельні роботи</u>	-	-	-	-	<u>Матеріали</u>				
Земляные работы	м3	5,70	150,00	855,00	бетон	м3	7	1700,00	11 900,00
Бетонные работы	м3	7	400,00	2 800,00	сетка дорожная 100\100	м2	62	35,00	2 170,00
Изготовление и монтаж металлоконструкций	тн	3,3	12 000,00	39 600,00	Проволока вязальная 1,2мм	кг	14	25,00	350,00
-					доска обрезная	м3	1	3500,00	3 500,00
-					швелер 12	м\п	42	240,00	10 080,00
-					швелер 10	м\п	100	188,00	18 800,00
-					проф.труба 80\80	м\п	180	70,00	12 600,00
-					проф.труба 20\40	м\п	260	41,70	1 082,00
					диски , электроды	ком	1	1400,00	1 400,00
					доставка				1 200,00
					ИТОГО по материалам на 1-й этап:				63 082,00
					<i>админ.расходы</i>	%	10		6 308,20
Итого по разделу:				43 255,00	Итого по разделу:				69 390,20

2-Й ЭТАП (КРОВЛЯ, ОКНА, ДВЕРИ)

Монтаж кровли	м2	140,00	150,00	21 000,00	Брус (150*50мм)	м3	4	4300,00	17 200,00
Монтаж купола	шт	1,00	3 500,00	3 500,00	Брус (50*50мм)	м3	4	4300,00	17 200,00
					Утеплитель под кровлю (100мм)	м2	115	55,00	6 325,00
					Металочерепица	м2	140	170,00	23 800,00
					Саморез по металлу	шт	2900	1,70	4 930,00
					Болт М10х140мм	шт	86	11,00	946,00
					Гайка М10	шт	86	9,00	774,00
					гидробарьер	м2	115	10,00	1 150,00
					паробарьер	м3	115	15,00	1 725,00
					Шайба М10	шт	172	1,20	206,40
					Саморез по дереву с пресшайбой 4.2х100мм	шт	1500	0,80	1 200,00
					дверь входная 1200\2100	шт	1	11800,00	11 800,00
					окна -7шт ,дверь 2100\1200 пвх	м2	10	2000,00	20 000,00
					проф.труба 20\40	м\п	260	41,70	9 760,00
					ИТОГО по материалам на 2-й этап:				117 016,40
					<i>админ.расходы</i>	%	10		<i>11 701,64</i>
Итого по разделу:				24 500,00	Итого по разделу:				128 718,04

3-Й ЭТАП (ОТДЕЛКА СТЕН,ПОЛЫ)

прокладка кабеля	м\п	166,00	15,00	2490,00	Кабель ПВС 3\2.5	м\п	126,00	19,00	2394,00
сборка щита	шт	1,00	450,00	450,00	Кабель ПВС 3\1.5	м\п	40,00	12,00	480,00
монтаж розеток,включателей	шт	22,00	50,00	1100,00	Гофра	м\п	200,00	3,00	600,00
					автомат 16А	шт	6,00	35,00	210,00
					автомат 25А	шт	4,00	35,00	140,00
					коробка распределительная	шт	14,00	24,00	336,00
					коробка инсталляция	шт	22,00	1,50	33,00
					розетки	шт	16,00	35,00	560,00
					включатель	шт	6,00	32,00	192,00
					эл. Щит	шт	1,00	435,00	435,00
					расходные материалы	комп	1,00	175,00	175,00
					трехтарифный счетчик	шт	1,00	2750,00	2750,00
					Конвектор электрический 700Вт	шт	4,00	2100,00	8400,00
Монтаж блок-хаус	м2	150	110,00	16 500,00	метал.блок-хаус	м2	150	165,00	24 750,00
Монтаж утеплитель	м2	150	20,00	3 000,00	саморезы по металлу	шт	1 200	1,00	1 200,00
Монтаж панели ПВХ	м2	240	40,00	9 600,00	утеплитель (100мм)	м2	150	55,00	8 250,00
Монтаж пола	м2	56	85,00	4 760,00	панели пвх стена	м2	240	90,00	21 600,00
					саморезы	шт	1 870	1,00	1 870,00



				цд рейка	шт	140	40,00	5 600,00
				утеплитель (100мм)	м2	56	55,00	3 080,00
				брус 50\50	шт	56	17,00	952,00
				доска половая	м2	56	240,00	13 440,00
				лак для доски				3 654,00
				ИТОГО по материалам на 3-й этап:				101 101,00
				<i>админ.расходы</i>	%	10		<i>10 110,10</i>
Итого по разделу:			37 900,00	Итого по разделу:				111 211,10

ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ РАБОТЫ:			105 655,00	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ МАТЕРИАЛЫ:				309 319,34
---------------------------------	--	--	-------------------	------------------------------------	--	--	--	-------------------

Приложение №2:

УТВАРЬ

Мебель:	Кол-во,шт	Цена,грн	Сумма,грн
Аналой (боковой)	2	2100	4200
Аналой (центральный)	1	3500	3500
Утварь:			
Паникадило	1	7500	7500
Бра на 2 свечи	8	750	6000
Бра на 3 свечи	3	980	2940
Светильники	2	1500	3000
Распятие не выше 150 см. С предстоящими	1	2650	2650
Подсвечник на 18 св	4	2300	9200
Хоругви (пара)	1	5500	5500
Запрестольные :икона+крест (пара)	1	5200	5200
Церковная кружка	2	850	1700
Голгофа	1	3000	3000
ИТОГО на утварь:			54390
<i>Админ.расходы</i>	<i>10%</i>		<i>5439</i>
Всего:			59829
